

Gerência de Projetos

Profa. Dra. Debora Maria
Barroso Paiva

Módulo 3 - Tópicos Avançados da Gerência de Projetos

Unidade 1 - Gerenciamento de comunicação em projetos
de software

Introdução

- **Comunicação** é uma das habilidades mais requisitadas no mercado em diversos setores.
- O gerenciamento da comunicação é o *planejamento*, a *execução* e o *monitoramento* de estratégias de comunicação.
 - Evitar ruído, interpretação equivocada, etc. (EUAX Consulting, 2024)

Introdução

- Os projetos possuem diferentes necessidades de comunicação, dependendo da complexidade, da quantidade de pessoas envolvidas, da cultura, do momento político da organização e do tipo de projeto. (EUAX Consulting, 2024)

Introdução

- Importância:
 - promover o alinhamento entre as partes interessadas
 - decodificação mais exata da mensagem, evitando ambiguidades na comunicação (EUAX Consulting, 2024)

Introdução

- **Comunicação** é a troca de informações, intencional ou involuntária. As informações trocadas podem estar em forma de ideias, instruções ou emoções. Os mecanismos pelos quais as informações são trocadas podem ser:
 - Em forma escrita (físicos ou eletrônicos)
 - Falados (presenciais ou remotos)
 - Formais ou informais (documentos ou em mídia social)
 - Por meio de gestos (tom de voz e expressões faciais)

- Dimensões da comunicação (TRT, 2024):
 - Interna (dentro do projeto) e externa (cliente, outros projetos, os meios de comunicação, o público)
 - Formal (relatórios, memorandos, instruções) e informal (e-mails, discussões ad hoc)
 - Vertical (nos níveis superiores e inferiores da organização) e horizontal (com colegas)

Introdução

- Dimensões da comunicação (TRT, 2024):
 - Oficial (boletins informativos, relatório anual) e não oficial (comunicações confidenciais)
 - Escrita e oral e Verbal e não-verbal (inflexões da voz, linguagem corporal)

Introdução

- As comunicações do projeto são baseadas em esforços para evitar mal-entendidos e equívocos de comunicação, pela seleção cuidadosa de métodos, meios e mensagens desenvolvidos a partir do processo de planejamento.
- Considere os 5Cs das comunicações escritas na redação de uma mensagem tradicional escrita (fora das mídias sociais) ou falada:

Introdução

- 5Cs das comunicações escritas:
 - **Correta** - Gramática e ortografia corretas
 - **Concisa** - Expressão concisa e eliminação do excesso de palavras
 - **Clara** - Propósito e expressão claros direcionados às necessidades do leitor
 - **Coerente** - Fluxo lógico e coerente de ideias
 - **Controlada** - Fluxo de palavras e ideias controlado

Introdução

- Inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam:
 - **planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e dispostas de maneira oportuna e apropriada**

Introdução

- Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas do projeto.
- A comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes interessadas do projeto. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Visão Geral do Gerenciamento das Comunicações do Projeto

10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Análise de requisitos das comunicações
 - .3 Tecnologias de comunicações
 - .4 Modelos de comunicações
 - .5 Métodos de comunicação
 - .6 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .7 Representação de dados
 - .8 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento das comunicações
 - .2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Atualização de documentos do projeto

10.2 Gerenciar as Comunicações

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Relatórios de desempenho do trabalho
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Tecnologias de comunicações
 - .2 Métodos de comunicação
 - .3 Habilidades de comunicação
 - .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - .5 Relatórios de projeto
 - .6 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .7 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Comunicações do projeto
 - .2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Atualizações de documentos do projeto
 - .4 Ativos de processos organizacionais

10.3 Monitorar as Comunicações

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Dados de desempenho do trabalho
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - .3 Representação de dados
 - .4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .5 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

Planejar o gerenciamento das comunicações (PMBOK)



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Planejar o gerenciamento das comunicações (PMBOK)

- Processo de desenvolver uma **abordagem apropriada** e um plano de comunicação do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas e nos ativos organizacionais disponíveis.
- O planejamento inadequado das comunicações pode causar problemas, tais como o atraso na entrega de mensagens, etc.

Planejar o gerenciamento das comunicações (PMBOK)

- Na maioria dos projetos, o planejamento das comunicações é feito bem no início.

Ferramentas e técnicas

- Análise de requisitos das comunicações
 - Determina as necessidades de informações das partes interessadas do projeto.
- Tecnologia de comunicações
 - Por exemplo, uma equipe de projeto pode usar diversas técnicas, desde conversas rápidas a reuniões longas, ou desde simples documentos escritos a materiais extensos.

Ferramentas e técnicas

- Modelos de comunicações
 - A troca de informações pode variar de acordo com o projeto e também nos vários estágios do mesmo projeto.
- Métodos de comunicação
 - Interativa, ativa e passiva
- Reuniões

- Plano de Gerenciamento das Comunicações:
 - Requisitos de comunicações das partes interessadas
 - Informações a serem comunicadas, incluindo idioma, formato, conteúdo e nível de detalhes
 - Pessoa responsável por comunicar as informações
 - Pessoa responsável por autorizar a liberação das informações confidenciais
 - Recursos alocados para as atividades de comunicação, incluindo tempo e orçamento

- Plano de Gerenciamento das Comunicações:
 - Glossário da terminologia comum
 - Diagramas do fluxo de informações no projeto, fluxos de trabalho com a sequência de autorização possível, lista de relatórios, planos de reuniões, etc
 - Restrições derivadas de leis ou regulamentos específicos, tecnologias, políticas organizacionais, etc

Gerenciar as comunicações



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Gerenciar as comunicações

- Processo de assegurar a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disposição final e adequada das informações do projeto
- Deve permitir flexibilidade nas atividades de comunicação, habilitando ajustes nos métodos e técnicas para acomodar as mudanças nas necessidades das partes interessadas e do projeto

Ferramentas e técnicas

- **Tecnologias de comunicações:**
 - Os fatores que influenciam a tecnologia incluem:
 - se a equipe está agrupada
 - a confidencialidade de quaisquer informações que precisam ser compartilhadas
 - recursos disponíveis para os membros da equipe
 - como a cultura da organização influencia a forma como as reuniões e discussões geralmente são realizadas.


Ferramentas e técnicas

- Métodos de comunicação:
 - A escolha de métodos de comunicação deve permitir flexibilidade se os membros da comunidade de partes interessadas, ou suas necessidades e expectativas, mudarem.
- Sistemas de informações de gerenciamento de projetos:
 - ferramentas eletrônicas, gerenciamento de mídias sociais

- Comunicações do projeto:
 - Podem incluir, mas não estão limitadas a:
 - relatórios de desempenho
 - situação das entregas
 - progresso do cronograma e custos incorridos
- Atualizações no plano de gerenciamento do projeto

- Atualizações nos documentos do projeto:
 - Registro das questões (problemas na comunicação)
 - Registro das lições aprendidas
 - Cronograma do projeto
 - Registro dos riscos
 - Registro das partes interessadas

Monitorar as comunicações

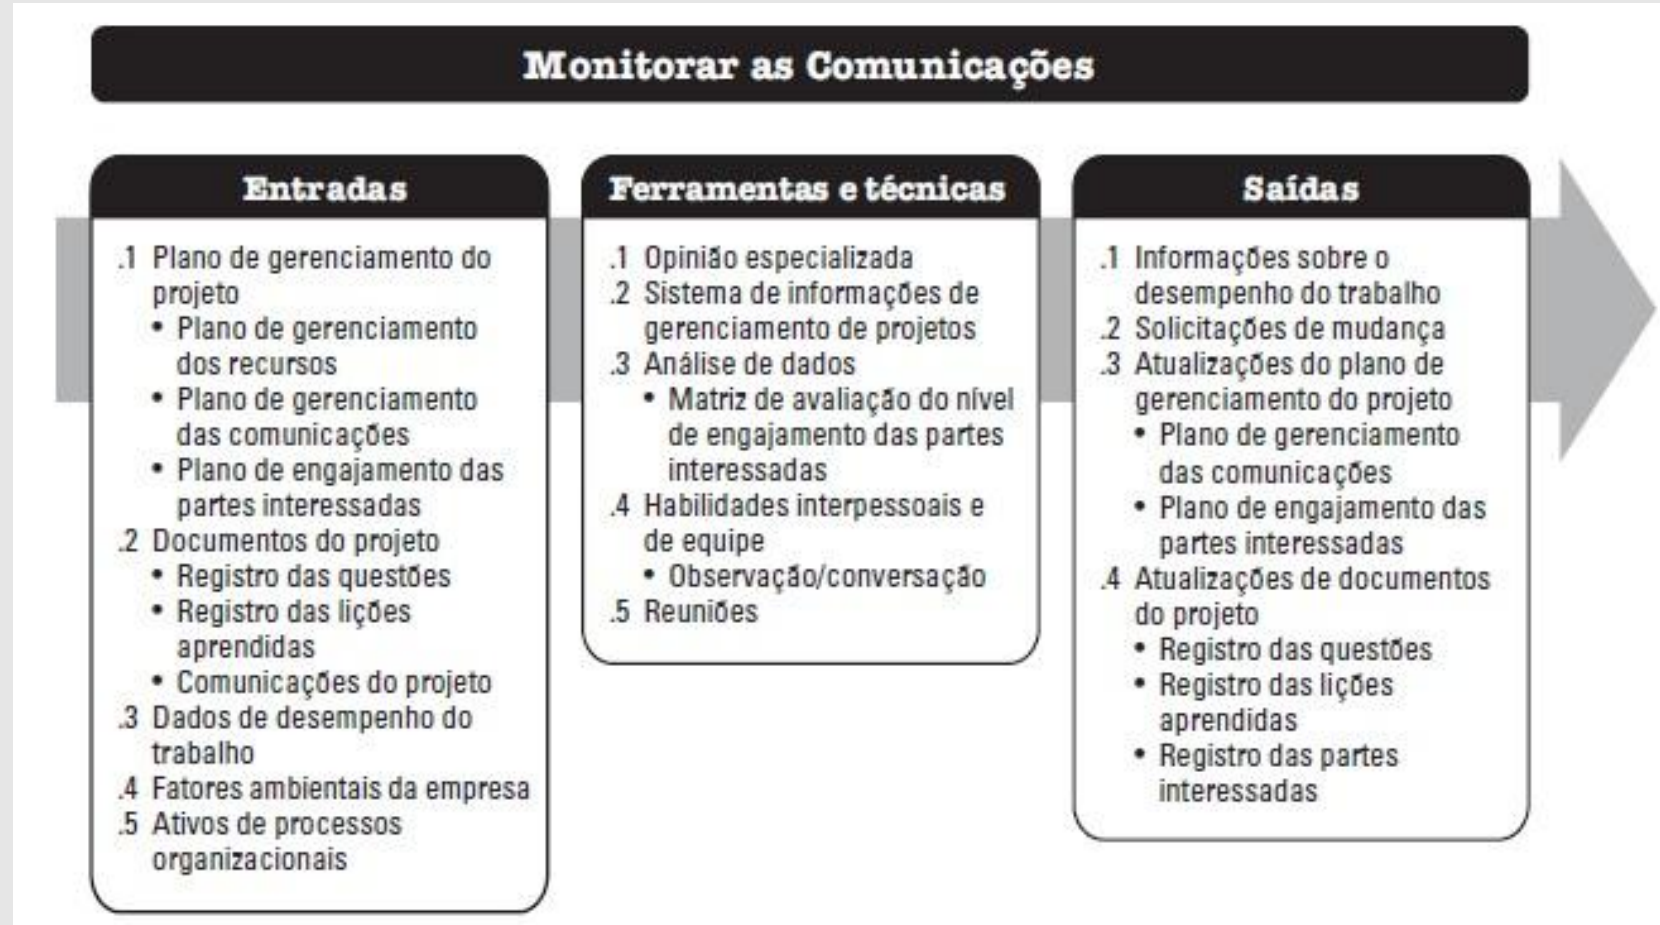

Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Monitorar as comunicações

- O principal benefício deste processo é o fluxo otimizado de informações, conforme definido no plano de gerenciamento das comunicações e no plano de engajamento das partes interessadas.
- Este processo é realizado ao longo do projeto.

Ferramentas e técnicas

- **Opinião especializada:**
 - Deve-se considerar o uso da expertise de indivíduos ou grupos com conhecimento ou treinamento especializado nos seguintes tópicos:
 - As comunicações com o público, a comunidade, a mídia e, em um ambiente internacional, entre grupos virtuais
 - Sistemas de gerenciamento de projetos e comunicações

Ferramentas e técnicas

- Habilidades interpessoais e da equipe:
 - Observação e conversa habilitam o gerente do projeto a identificar questões dentro da equipe, conflitos entre pessoas ou questões de desempenho individuais.
- Reuniões:
 - As reuniões são usadas para tomar decisões; responder a solicitações das partes interessadas; e conversar com fornecedores, prestadores de serviços e outras partes.

- Informações sobre o desempenho do trabalho:
 - Incluem informações sobre o desempenho da comunicação do projeto, comparando as comunicações implementadas com as planejadas.
 - Também considera feedback sobre comunicações, tais como resultados de pesquisas sobre eficácia da comunicação.

- Solicitações de mudança:

- Necessidade de ajuste, ação e intervenção em atividades de comunicação definidas no plano de gerenciamento das comunicações.
- Essas solicitações de mudança podem resultar em:
 - Revisão de requisitos de comunicação das partes interessadas, incluindo distribuição, conteúdo ou formato e método de distribuição de informações
 - Novos procedimentos para eliminar gargalos

- Atualizações no plano de gerenciamento do projeto:
 - Qualquer mudança no plano de gerenciamento do projeto passa pelo processo de controle de mudanças da organização através de uma solicitação de mudança.
- Atualizações nos documentos do projeto:
 - Pode haver registro das questões, progresso e resolução.
 - Registro das lições aprendidas.

Habilidades de comunicação

- Ouvir ativamente e de modo eficaz;
- Perguntar, investigando ideias e situações para garantir um melhor entendimento;
- Educar a fim de aumentar o conhecimento da equipe para que ela seja mais eficaz;
- Levantar fatos para identificar ou confirmar as informações;
- Definir e administrar as expectativas;

Habilidades de comunicação

- Persuadir uma pessoa ou empresa a executar uma ação;
- Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes;
- Solucionar conflitos para evitar impactos negativos; e
- Resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes. (TRT, 2024)

Considerações finais

- Boa comunicação é fundamental para garantir que aquilo que o cliente está pensando é o mesmo que o gerente de projetos entendeu e o mesmo que a equipe do projeto vai entregar.
- Fazer adaptações ao plano de comunicações sempre que preciso.
- O gerente de projetos precisa ficar atento e adequar a comunicação ao momento do projeto. (EUAX, 2024)

Considerações finais

- O gerenciamento da comunicação garante que a comunicação seja ***correta, concisa, clara, coerente e controlada***.

Referências

EUAX Consulting. **Gerenciamento da comunicação: o que é, qual a importância e como fazer em 3 passos.** Disponível em <https://www.euax.com.br/2019/05/gerenciamento-da-comunicacao/>. Acessado em 02/05/2024

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). ISBN 9781628253924. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia Pmbok)**. 6. Edição. 2017. Recurso Online: <https://link.ufms.br/fZQAq>.

TRT. **Gerenciamento das Comunicações do Projeto**. Disponível em <https://link.ufms.br/hl6pb>. Acessado em 06/05/2024

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

