

Gerência de Projetos

Profa. Dra. Debora Maria
Barroso Paiva

Módulo 4 - Considerações Finais sobre Gerência de Projetos

Unidade 1 - Gerenciamento de integração em projetos de
software



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Introdução

- Inclui os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos grupos de processos de gerenciamento do projeto. Além disso:
 - Fazer escolhas sobre alocação de recursos
 - Concessões entre objetivos e alternativas conflitantes
 - Gerenciamento das dependências mútuas entre as áreas de conhecimento

Introdução

- O gerente do projeto é quem **combina os resultados em todas as outras Áreas de Conhecimento** e tem a visão geral do projeto. Ele é responsável pelo projeto como um todo.
- O gerente de projeto assume um papel importante nos processos de integração, considerando suas habilidades de ***liderança, resolução de problemas, comunicação***, etc.

Introdução

- Os projetos e o gerenciamento de projetos são integradores por natureza.
 - Por exemplo, uma estimativa de custos necessária para um plano de contingência envolve a integração dos processos nas Áreas de Conhecimento de *Gerenciamento dos Custos do Projeto*, *Gerenciamento do Cronograma do Projeto* e *Gerenciamento dos Riscos do Projeto*.


Introdução

- O Gerenciamento da Integração do Projeto envolve:
 - Garantir que as datas finais de entrega do produto, serviço ou resultado, do ciclo de vida do projeto e do plano de gerenciamento de benefícios estejam alinhadas;
 - Fornecer um plano de gerenciamento do projeto para atingir os objetivos do projeto;
 - Assegurar a criação e o uso do conhecimento apropriado de e para o projeto conforme for necessário.

Introdução

- O Gerenciamento da Integração do Projeto envolve:
 - Gerenciar o desempenho e as mudanças das atividades no plano de gerenciamento do projeto;
 - Tomar decisões integradas em relação às mudanças chave que impactam o projeto;
 - Medir e monitorar o progresso do projeto e tomar as medidas necessárias para atender aos seus objetivos;
 - etc.

Visão Geral do Gerenciamento da Integração do Projeto

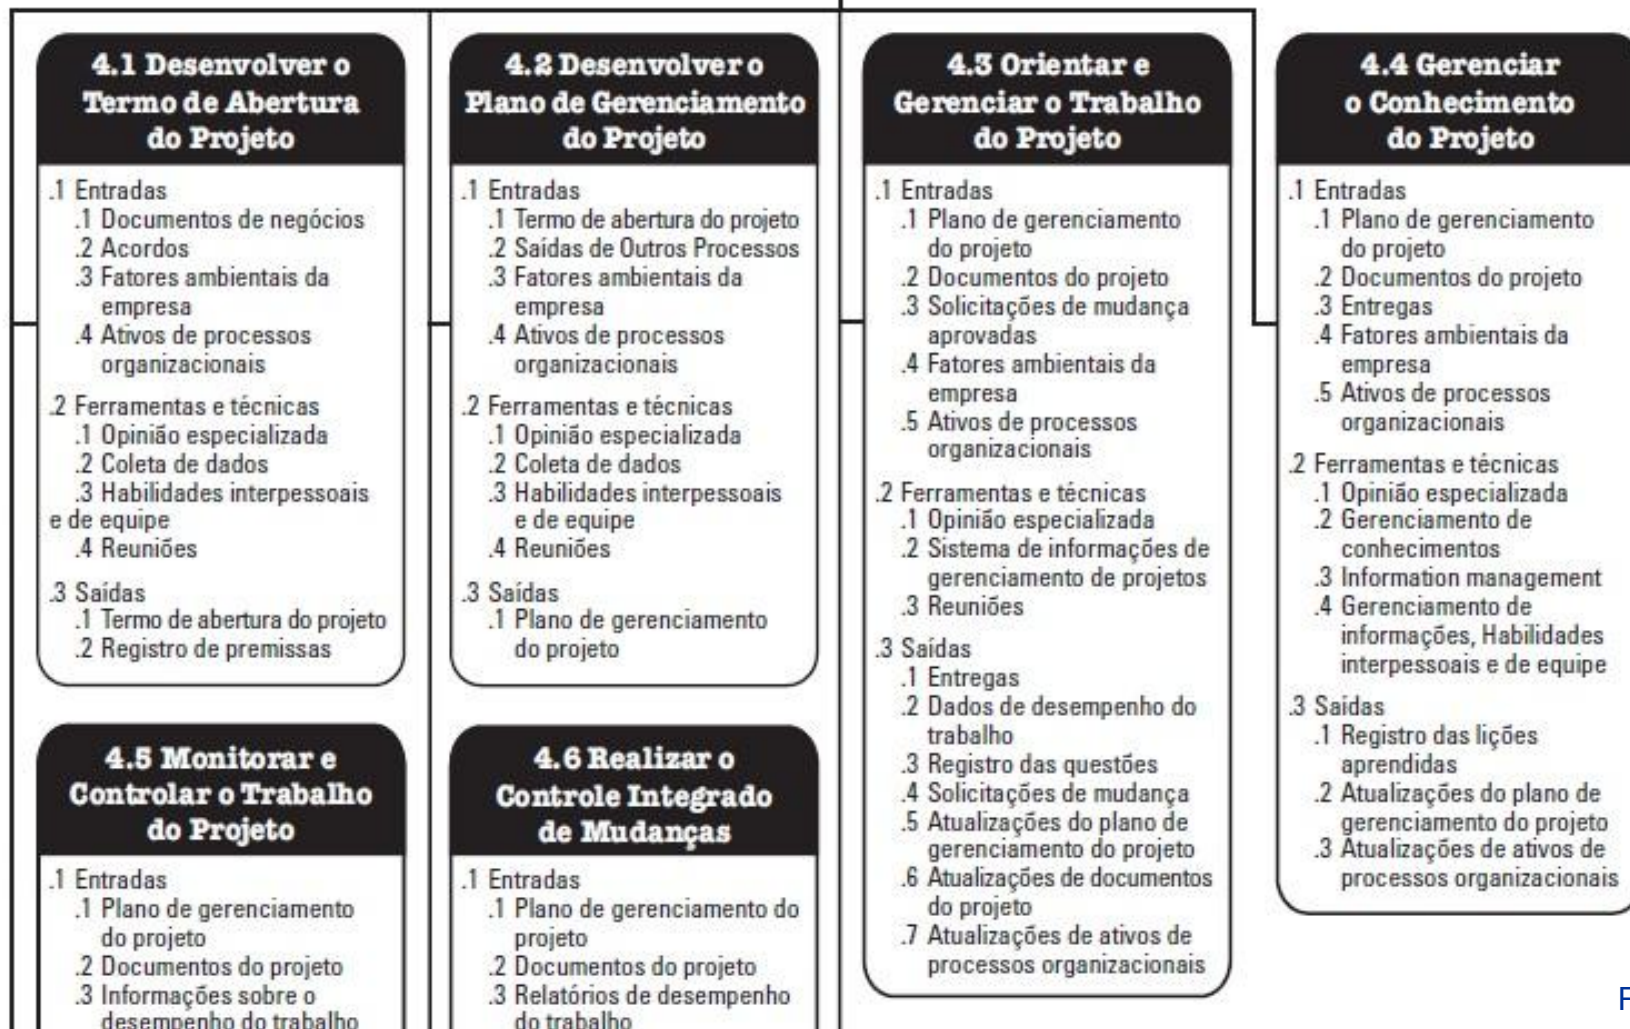


Desenvolver o termo de abertura do projeto



- Autoriza a existência de um projeto.
- Fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

Desenvolver o termo de abertura do projeto

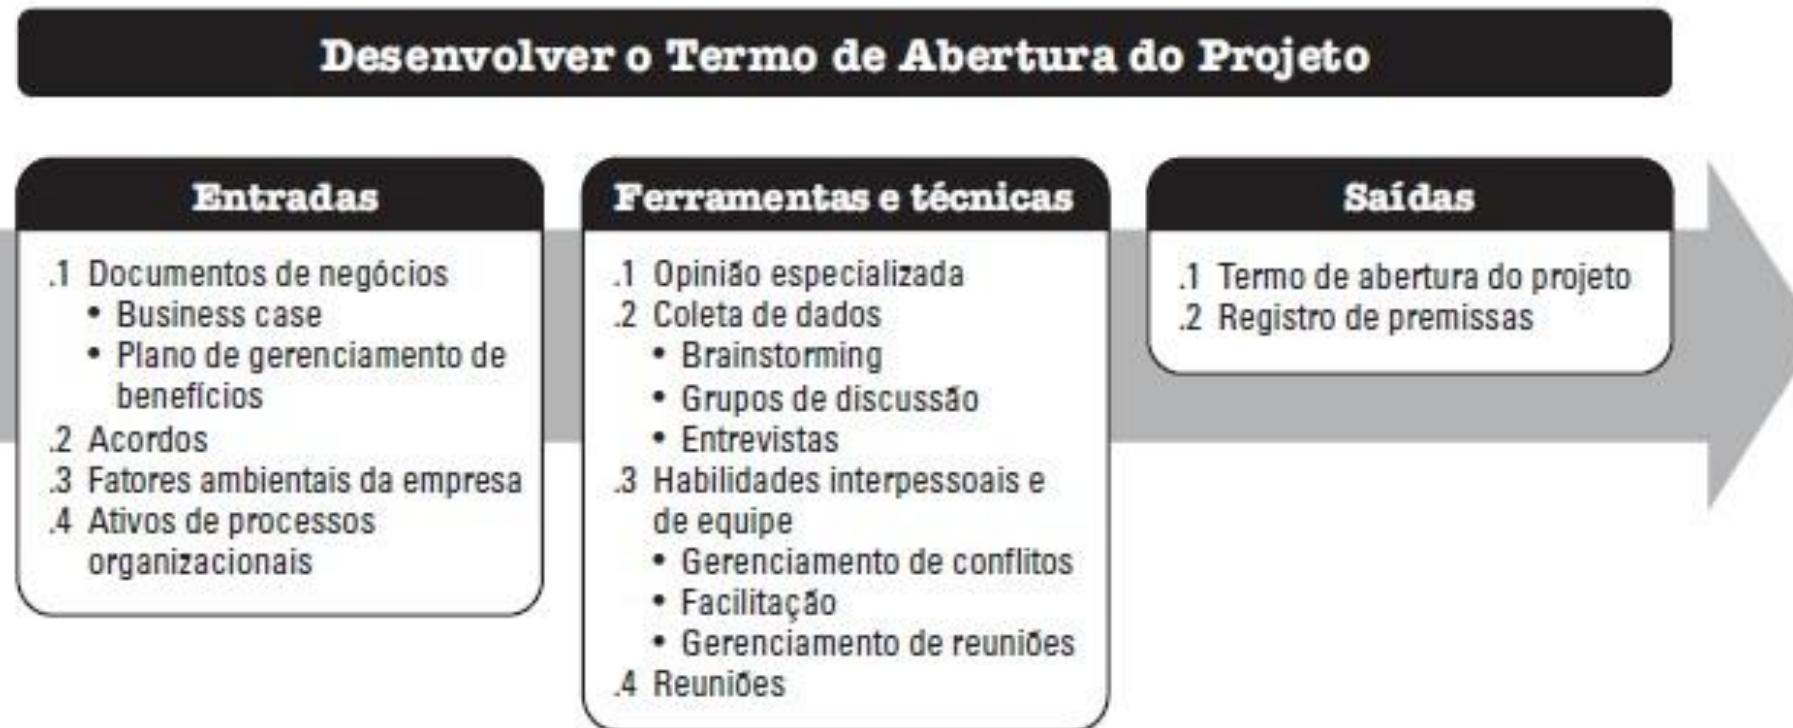

Entradas: *Business Case*

- O *business case* descreve as informações necessárias do ponto de vista de negócios, para determinar se o projeto justifica ou não o seu investimento.
- Apresenta a necessidade de negócios, análise de custo-benefício e limites baseado em informações das partes interessadas.

Entradas: *Business Case*

- Cabe ao gerente do projeto garantir que o projeto cumpra de maneira eficaz o que foi informado no *business case*.
- Em projetos com várias fases, o *business case* pode ser revisado periodicamente para assegurar que o projeto está na direção certa.

Entradas: fatores ambientais da empresa

- Fatores ambientais da empresa se referem às condições fora do controle da equipe do projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto. Fatores ambientais que influenciam:
 - Padrões governamentais, padrões industriais ou regulamentos;
 - Estrutura e cultura organizacionais;
 - Condições do mercado.

Saídas: termo de abertura do projeto

- O termo de abertura do projeto é o documento emitido pelo responsável pela iniciação do projeto, ou patrocinador do projeto, que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.
- Indica a todos que determinado projeto está sendo desenvolvido e reforça o poder do gerente.

Saídas: termo de abertura do projeto

- Documenta informações de alto nível sobre o projeto e sobre o produto, serviço ou resultado que o projeto deve satisfazer:
 - Finalidade do projeto;
 - Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados;
 - Requisitos de alto nível;
 - Descrição de alto nível do projeto, seus limites e entregas-chave.

Saídas: termo de abertura do projeto

- Documenta informações de alto nível sobre o projeto e sobre o produto, serviço ou resultado que o projeto deve satisfazer:
 - Risco geral do projeto;
 - Resumo do cronograma de marcos;
 - Recursos financeiros pré-aprovados;
 - Lista das partes interessadas chave;
 - etc.

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto



- É o processo de definição, preparação e coordenação de todos os componentes do plano e a consolidação em um plano de gerenciamento integrado do projeto.
- Esse processo é realizado uma vez ou em pontos pré definidos no projeto.

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Ferramentas e técnicas: coleta de dados

- **Brainstorming:** reunir ideias e soluções sobre a abordagem do projeto
- **Listas de verificação:** muitas organizações padronizaram as listas de verificação disponíveis com base em experiência própria ou usam listas de verificação do setor
- **Grupos de discussão:** reúnem as partes interessadas para discutir a abordagem do gerenciamento de projetos e a integração dos diferentes componentes do plano de gerenciamento do projeto

Ferramentas e técnicas: habilidades interpessoais e de equipe

- **Gerenciamento de conflitos:** alinhar as diversas partes interessadas em relação a todos os aspectos do plano de gerenciamento do projeto
- **Facilitação:** garante que os participantes alcancem uma compreensão mútua, que todas as contribuições sejam consideradas e que conclusões ou resultados sejam plenamente aceitos de acordo com o processo de decisão estabelecido para o projeto

Ferramentas e técnicas: habilidades interpessoais e de equipe

- **Gerenciamento de reuniões:** é necessário para garantir que as inúmeras reuniões requeridas para desenvolver, unificar e chegar a um acordo sobre o plano de gerenciamento do projeto são bem executadas

Saídas: desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

- É o documento que descreve como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado.
- Integra e consolida todos os planos de gerenciamento auxiliares, linhas de base e outras informações necessárias para gerenciar o projeto.

Saídas: desenvolver o plano de gerenciamento do projeto


- Componentes:
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Plano de gerenciamento dos requisitos
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Plano de gerenciamento dos custos
 - Plano de gerenciamento da qualidade
 - Plano de gerenciamento dos recursos
 - Plano de gerenciamento da comunicação, etc

Orientar e gerenciar o trabalho do projeto



- É o processo de liderar e realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementar as mudanças aprovadas para atingir os objetivos do mesmo.
- Requer a análise do impacto de todas as mudanças no projeto e a implementação das mudanças aprovadas: ação corretiva, ação preventiva e/ou reparo de defeito.

Orientar e gerenciar o trabalho do projeto

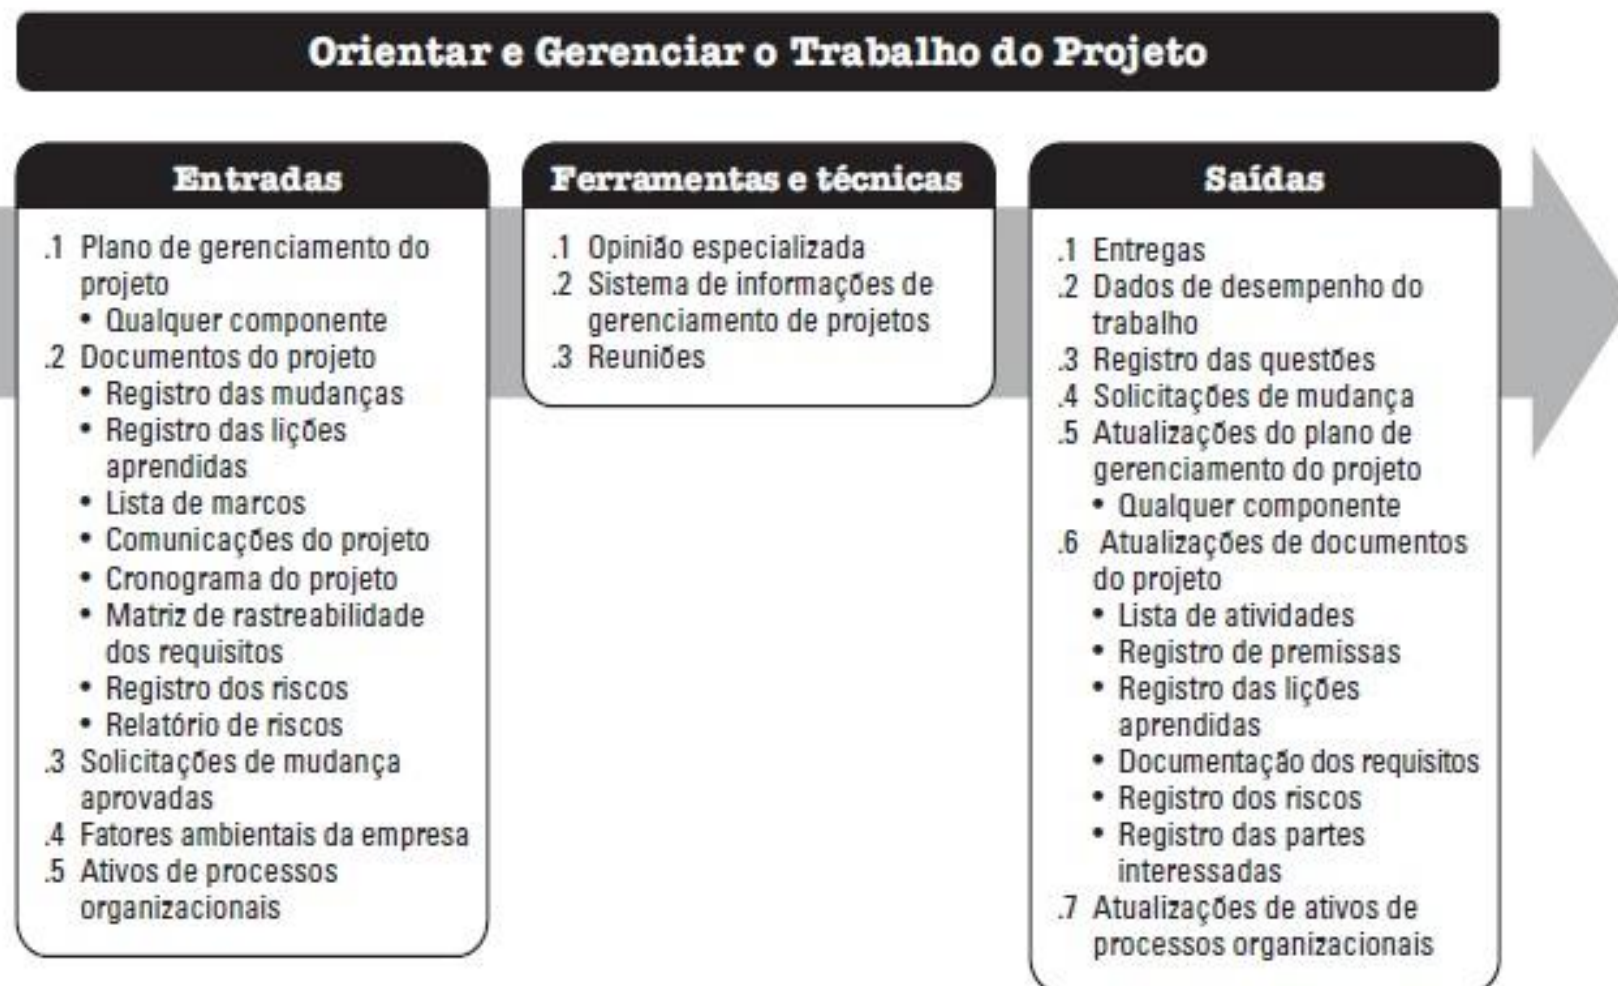

Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Entradas: documentos do projeto

- Registro das mudanças
- Lições aprendidas
- Lista de marcos
- Comunicações do projeto
- Cronograma
- Matriz de rastreabilidade dos requisitos
- Registro dos riscos
- Relatório dos riscos

Ferramentas e técnicas



- Opinião especializada
- Sistemas de informações


Gerenciar o conhecimento do projeto

- Processo de utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional.
- O conhecimento é comumente dividido em “**explícito**” (que pode ser facilmente codificado usando palavras, imagens e números) e “**tácito**” (pessoal e difícil de expressar, como crenças, entendimentos, experiência e “know-how”).

Gerenciar o conhecimento do projeto

- De uma perspectiva organizacional, o gerenciamento do conhecimento envolve garantir que as habilidades, experiências e *expertise* da equipe do projeto e de outras partes interessadas sejam utilizados antes, durante e depois do projeto.
- A parte mais importante do gerenciamento do conhecimento é criar uma atmosfera de confiança para que as pessoas sejam motivadas a compartilhar seus conhecimentos.

Gerenciar o conhecimento do projeto

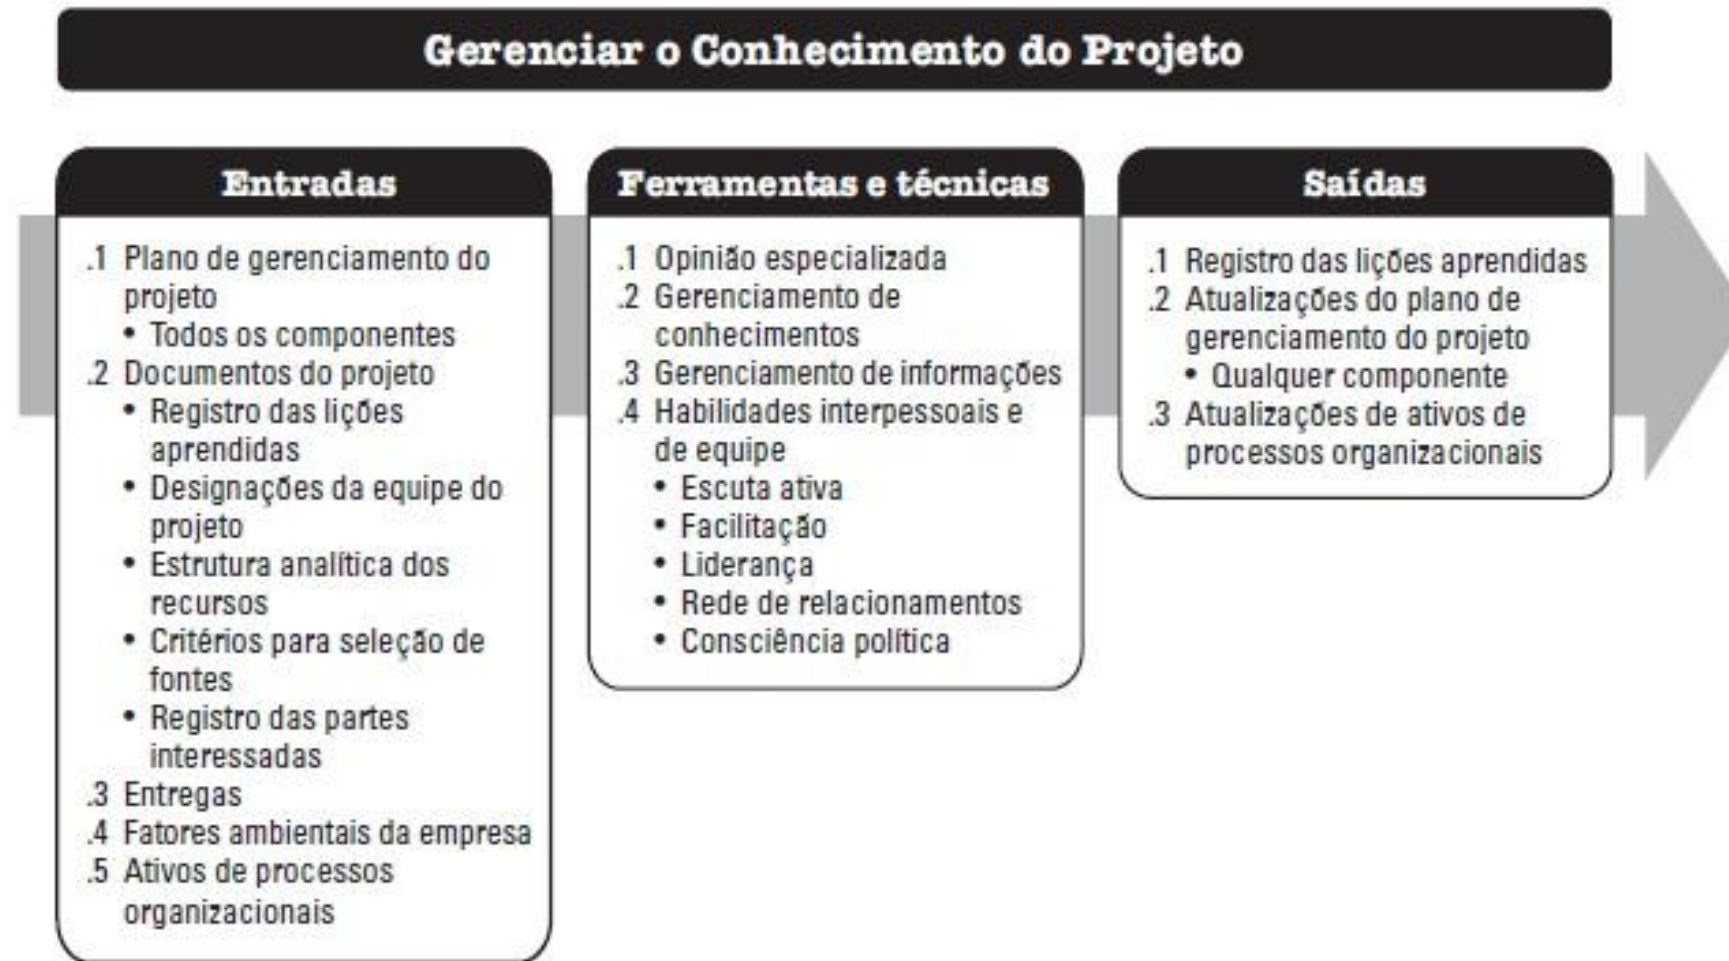

Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Entradas: documentos do projeto

- Registro das lições aprendidas
- Atribuições da equipe do projeto
- Estrutura analítica dos recursos (pode ajudar a compreender qual conhecimento está disponível como grupo e qual conhecimento está faltando)
- Registro das partes interessadas

Entradas: fatores ambientais da empresa

- Cultura organizacional, das partes interessadas e do cliente
- Distribuição geográfica de instalações e recursos
- Especialistas de conhecimento organizacional
- Requisitos e/ou restrições legais e regulamentares

Ferramentas e técnicas: gerenciamento de conhecimentos



- Conectam pessoas para que possam trabalhar juntas e criar novos conhecimentos, compartilhar conhecimento tácito e integrar o conhecimento dos membros diversificados da equipe.

Ferramentas e técnicas: gerenciamento de conhecimentos

- Rede de relacionamentos, incluindo redes sociais online e interação social informal
- Reuniões
- Aprendizagem por observação
- Fóruns de discussão
- Eventos de compartilhamento de conhecimento, tais como seminários e conferências
- Feiras e cafés de conhecimentos, etc.

Saídas: registro das lições aprendidas

- O registro das lições aprendidas também pode incluir o impacto, recomendações e ações propostas associadas com a situação.
- O registro das lições aprendidas pode incluir dificuldades, problemas, riscos e oportunidades percebidas, ou outro conteúdo conforme apropriado.

Saídas: registro das lições aprendidas

- O conhecimento pode ser documentado usando vídeos, fotos, áudios ou de qualquer outra forma adequada, que garanta a eficiência das lições capturadas.
- Ao final de um projeto ou fase, as informações são transferidas para um ativo de processo organizacional chamado de repositório de lições aprendidas.

Considerações Finais

- Gerenciamento de integração em projetos de software é uma atividade burocrática, dependente de outros processos do PMBOK.
- Conhecimento adquirido pelas equipes e lições aprendidas são essenciais para o sucesso da execução desse processo.

Referências



PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). ISBN 9781628253924. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia Pmbok)**. 6. Edição. 2017. Recurso Online: <https://link.ufms.br/fZQAq>.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

